



COMUNE DI / COMUN DE
SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN
 PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 154
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardecchia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. Approvazione I modifica del contratto durante il periodo di validità (variante in corso d'opera).

ARGOMENT: *Lurieres de gran prescia per meter en segurezza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan. Aproèr l I mudament del contrat endèna che l'é valevol (mudament endèna che vegn fat i lurieres).*

L'anno *duemilaventi* addì *ventisei* del mese di *ottobre* alle ore **16.30** in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

L'an doimilevint ai vintesie del meis de otober da les 16.30 en videoconferenza, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina adum la Jonta de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

FLORIAN Giulio	- Sindaco <i>Ombolt</i>
PEDROTTI Germano	- Vicesindaco <i>Vizeombolt</i>
CINCELLI Lisanna	- Assessore <i>Assessor</i>
DELLAGIACOMA Lucia	- Assessore <i>Assessor</i>
ZULIAN Simone	- Assessore <i>Assessor</i>

Presenti <i>Tol pèrt</i>	Assenti <i>No tol pèrt</i>
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario generale supplente signora
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl suplent signora

dott.ssa ELISABETTA GUBERT

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l signor

GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
 SINDACO/OMBOLT

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argument dit de sora.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2)

RELAZION DE PUBLICAZION
 (Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario generale supplente, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno / *Gé sotscrit Secretèr Generèl suplent, aldò de la declarazion del Suté, zertifichèe che na copia de chest verbal la vegn publichèda ai*

30.10.2020

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **30.10.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
 SUPLENTE
L SECRETÈR GENERÈL SUPLENT
 dott.ssa Elisabetta Gubert

Codice Univoco Ufficio
Codesc Unich de l'Ofize:
UFQCHA

CUP: F63H19001200007
CIG: 8147426C9E (Sevis Srl)

CIG: ZA82983FC7
 (prog.+DL ing. Pederiva)

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardecchia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. Approvazione I modifica del contratto durante il periodo di validità (variante in corso d'opera). PREMESSO che: - con Legge Regionale del 31 ottobre 2017 n. 8, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2018, il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa; - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa – Poza e Vigo di Fassa – Vich; - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 25/09/2018, pubblicata nella G.U. – 1^a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 28/11/2018 e sul B.U.R. n. 49 del giorno 6/12/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2017 nelle parti in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», a far data dal giorno 7/12/2018 (compreso), la nuova denominazione del Comune è: Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan; PREMESSO altresì che: - a seguito di abbondanti precipitazioni verificatesi il 26 luglio 2019, il Sindaco pro-tempore e il Funzionario del Servizio Bacini Montani della PAT dott. Andrea Darra, si sono recati in sopralluogo lungo il rio Sojal nella frazione di Pera di Fassa per verificare la situazione degli argini; in particolare quelli che proteggono il tubo di adduzione principale dell'acquedotto a servizio degli abitati di Pera, Vigo e Pozza, le tre frazioni del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan; - in relazione a quanto rilevato, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio nel corso di un primo sopralluogo congiunto di data 29.7.2019 con il responsabile di zona del Servizio Prevenzioni Rischii della PAT, geom. Italo Battisti, ha constatato la pericolosità e l'urgenza di porre soluzione alla situazione creatasi con l'evento metereologico sopra ricordato; - in data 2 agosto 2019 si è svolto un successivo sopralluogo lungo il corso del rio Sojal al quale ha partecipato il Responsabile del Servizio Lavori	ARGOMENT: <i>Lurieres de gran prescia per meter en segurezza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan. Aproèr l I mudament del contrat endèna che l'é valevol (mudament endèna che vegn fat i lurieres).</i> DIT DANTFORA che: - co la Lege Regionèla dai 31 de otober del 2017 n. 8 l'è stat metù en esser, a tachèr dal 1^m de jené del 2018, l nef Comun de Sèn Jan dò la fujion anter i Comuns de Poza e Vich; - aldò de l'art. 3, coma 1, de la medema L.R. n. 8/2017, l nef Ent l'é doventà l titolèr de duc i bens mòboi e no mòboi e de duta la situazions giuridiches atives e passives di Comuns che l'era dant; - aldò de la sentenza de la Cort Costituzionèla n. 210 dai 25/09/2018, publichèda te la G.O. – 1^a serie spezièla – Cort Costituzionèla n. 47 dai 28/11/2018 e tel B.O.R. n. 49 dai 6/12/2018, che l'à declarà la ilegitimità costituzionèla de la L.R. n. 8/2017 te la pèrts olache vegn durà l'inom "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan" empede chel de "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan", a tachèr dai 7/12/2018 (tout ite), l'inom nef del Comun l'é: Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan; DIT DANTFORA amò che: - dò la gran sdravarides states ai 26 de messèl del 2019 l'Ombolt e l Funzionèr del Servije per la Èghes da Mont de la PAT dr Andrea Darra i è jic a fèr n soralech enlongia l Ruf de Soal, te la frazion de Pera, per controlèr la situazion de la spones del ruf e, soraldut, de cheles che tol ite l condot prinzipèl del bosserlait che serf i païjes de Pera, Vich e Poza, la trei fraziions del Comun de Sèn Jan; - aldò de ches l Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie, endèna l soralech dai 29.07.2019 fat col responsabol de raion del Servije Prevenzion Riscès de la PAT, geom. Italo Battisti, l'à zertà che l'era pericol e che ge volea troèr na soluzion en prescia a la situazion entravegnuda co l'event meteorologich recordà sunsora; - ai 2 de aost del 2019 l'é stat fat n auter soralech enlongia l Ruf de Soal, a chel che à tout pèrt l Responsabol del Servije Lurieres Publics e
---	--

Pubblici e Patrimonio ing. Francesca Chiocchetti, il collaboratore amministrativo del medesimo Servizio, p.ind. Aldo Rasom e l'ing. Alessandro Pederiva, dove è emerso la necessità di intervenire in somma urgenza, per mettere in sicurezza, sia la strada forestale esistente che, soprattutto, la tubatura dell'acquedotto presente sotto la sede stradale dalle piene del rio Sojal;

- l'intervento risulta fondamentale al fine di garantire la funzionalità dell'acquedotto che serve il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan nonché per mettere in sicurezza, come detto sopra, la strada forestale, unica via di accesso alternativa al percorso principale per raggiungere il Gardecia che, dopo gli eventi meteo dell'autunno scorso, è stata chiusa a periodi, al fine di consentire lo sgombero dei materiali che avevano invaso la sede stradale;
- si prevedono altresì una serie di interventi mirati al fine di salvaguardare la viabilità e l'acquedotto comunale esistente, con la realizzazione di due attraversamenti sul rio Sojal, anche per i pedoni, mediante soluzioni da concordare con i vari servizi provinciali;
- con verbale di somma urgenza di data 6 agosto 2019, prot. n. 8881, inviato al Servizio Prevenzione Rischi della PAT, sono stati indicati gli interventi necessari per i lavori di somma urgenza in parola, al quale si rimanda per un più dettagliato esame;
- con nota S033/2019/21.6 di data 19 agosto 2019, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 9357, il Servizio Prevenzione Rischi della PAT comunica che a seguito di verbale di sopralluogo ed accertamento, effettuato dal responsabile di zona geom. Italo Battisti, vengono ritenuti sussistenti gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 9/2011 e pertanto sono considerati ammessi a finanziamento i lavori di somma urgenza contenuti nel citato verbale di data 6 agosto 2019;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 167 del 19 agosto 2019 è stato affidato all'ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) l'incarico della progettazione, coordinamento, Direzione Lavori e rilievo planialtimetrico per i "lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del Rio Sojal a quota 1.600 e 1.700 m s.l.m. nella valle di Gardecia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan";
- il punto n. 5 del dispositivo del predetto provvedimento recita: "di dare infine atto che l'impegno di spesa relativo al presente incarico, pari ad € 11.063,53-, verrà regolarizzato con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 200 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2";

Patrimoni enj. Francesca Chiocchetti, l colaborador aministratif del medemo Servije, p. ind. Aldo Rasom e l'enj. Alessandro Pederiva, te chel che l'é vegnù al luster l besegn de fèr n intervent de gran prescia per meter en segurezza dal pericol che l Ruf de Soal l vegne sorafora tant la strèda da bosch che l'é jà che, soraldut, l condot del bosserlait logà sot la strèda;

- *chest intervent l'é de gran besegn per arseguirèr che l bosserlait che l serf l Comun de Sèn Jan l vae coche carenea e per meter en segurezza, desche dit sunsora, la strèda da bosch che l'é l soul azess alternatìf al percors prinzipèl per ruèr te Gardecia e che, dò i evenc meteorologics entravegnui d'uton de l'an passà, la é stata serèda sù, per vèlch trat de temp, per dèr l met de menèr demez l materièl che aea empienti la strèda medema;*
- *vegn pervedù ence na lingia de intervenc per stravardèr la viabilità e l bosserlait de Comun en esser, co l'enjignèr doi passajes sul Ruf de Soal, ence per chi che va a pé, con soluzions e projec da dezider adum coi desvalives servijes provinzièi;*
- *col verbal de gran prescia dai 6 de aost del 2019, prot. n. 8881, manà al Servije de Prevenzion di Risesc de la PAT, l'é stat spezificà i intervenc per i lurieres de gran prescia en costion, a chel che vegn fat referiment per maor informazions;*
- *co la comunicazion S033/2019/21.6 dai 19 de aost del 2019, registrèda te protocol de Comun la medema di col n. 9357, l Servije de Prevenzion di Risesc de la PAT l met en consaputa che, aldò del verbal de soralech e zertament enjignà dal responsabol de raion geom. Italo Battisti, vegn conscidrà che sibie la condizion pervedudes da l'art. 37, c. 1 de la L.P. 9/2011 e che, donca, vegn ametù a finanziament i lurieres de gran prescia spezifiché tel verbal nominà sunsora dai 6 de aost del 2019;*
- *co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimoni n. 167 dai 19 de aost del 2019 g'é stat dat sù a l'enj. Alessandro Pederiva, col Studie a Ciavaleis (TN), la encèria de enjignèr l projet, l coordinèr e fèr la direzion di lurieres e l relief palnialtimetrich per i "Lurieres de gran prescia per meter en segurezza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1.600 e 1.700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan";*
- *l pont n. 5 del despositif del provediment soradit l disc: "de dèr at, tinultima, che l'empegn de cost per chesta encèria, de € 11.063,53-, l vegnarà regolarisà con n provediment aposta, aldò de l'art. 200 del "Codesc di Enc locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2";*

- l'art. 200 comma 1 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., dal quale si evince che <i>per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinanza fatta a terzi è regolarizzata entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine</i>; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 177 del 29 agosto 2019 è stato pertanto regolarizzato ai sensi dell'art. 200 del CEL "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. l'incarico affidato in data 19 agosto 2019; - con nota di data 20 settembre 2019 l'ing. Alessandro Pederiva ha consegnato la perizia dei lavori in parola, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 10716; - ai sensi dell'art. 53 c. 3 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm., l'approvazione della perizia dei lavori deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data del processo verbale di somma urgenza; - con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 25 settembre 2019 è stata approvata la perizia dei "Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan", redatta dall'ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) e acclarante il costo complessivo di € 140.000,00- di cui € 103.583,70- per lavori a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.040,53- ed € 36.416,30- per somme a disposizione dell'amministrazione; - il punto 5. del dispositivo della suddetta deliberazione demanda al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio gli atti conseguenti dall'adozione del provvedimento testé ricordato in qualità di Responsabile del Procedimento; - con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 256 del 17 dicembre 2019 è stato affidato all'impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga (TN) l'incarico per la realizzazione dei lavori di somma urgenza in parola verso l'importo contrattuale complessivo di € 102.075,55- più IVA al 22%, così ottenuto applicando il ribasso dell'1,50% sull'importo di computo metrico estimativo redatto dall'ing. Pederiva pari ad € 100.543,17- più € 3.040,53- relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - con il medesimo provvedimento è stato approvato	- <i>l'art. 200, coma 1 "Regoles per tor sù empegnes de cost e per fèr compres" del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin – Südtirol", aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 e s.m., l perveit che "per i lurieres, la compres e la prestacions che vegn ca da n event ecezionèl o che no se pel perveder, l'orden che ge vegn fat a sogec foravia l vegn regolarisà dant che sibie fora 30 dis e, aboncont, dant dai 31 de dezimmer de l'an en cors, se enlouta no l'é amò jit fora l termen soradit";</i> - <i>co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 177 dai 29 de aost del 2019 l'é stat regolarisà, aldò de l'art. 200 del CEL "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol", aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2 e s.m., la encèria data sù al 19 de aost del 2019;</i> - <i>co la comunicazion dai 20 de setember del 2019 l'enj. Alessandro Pederiva l'à consegnà la perizia di lurieres en costion, registrèda te protocol de Comun la medema di col n. 10716;</i> - <i>aldò de l'art. 53 c. 3 de la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., l'aproazion de la perizia di lurieres la cogn vegnir fata dant da 45 dis da la di che l'é stat enjignà l verbal de gran prescia;</i> - <i>co la deliberazion de la Jonta de comun n. 137 dai 25 de setember del 2019 l'é stat aproà la perizia di "Lurieres de gran prescia per meter en segurezza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tagnir del Comun de Sèn Jan", enjignèda da l'enj. Alessandro Pederiva con Studie fora Ciavaleis (TN) e che la met dant l cost en dut de € 140.000,00- spartì sù te € 103.583,70- per lurieres da dèr fora con apalt, tout ite i cosc per la segurezza de € 3.040,53-, e € 36.416,30- per somes a la leta de l'aministrazion;</i> - <i>l pont 5. de la deliberazion recordèda sunsora l ge dèsc sù la encèria al Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie de fèr dut chel che serf per meter en दौरa l provediment, desche Responsabol del prozediment;</i> - <i>co la determinazion del Responsabol del Servije Lurieres Publics e Patrimonie n. 256 dai 17 de dezimmer del 2019 ge é stat dat sù a la firma SEVIS SRL con senta legala a Soraga (TN) la enceria per meyer a jir i lurieres de gran prescua en chestion en vers l'emport de contrat de €102.075,55- en dut più SVE al 22%, che l vegn fora dal rebas sport de l'1,50% su la zifra del Calocol cosc e cantitèdes metù jù da l'enj. Pederiva valif a €100.543,17- più € 3.040,53 per agravies de la segurezza no sotmetui a rebas;</i> - <i>col medemo provediment l'é stat aaproà enche l</i>
--	--

altresi lo schema di contratto da stipularsi con la predetta impresa;

- in data 31 gennaio 2020 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa SEVIS SRL, giusta n. 191/AP di pari data, firmato digitalmente;
- con processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza la DL ing. Alessandro Pederiva ha consegnato i lavori in data 19 agosto 2019, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 13.1.2020 al n. 353;
- per l'esecuzione dei lavori su indicati, erano previsti 60 giorni decorrenti dalla data del verbale stesso, pertanto da ultimarsi entro il 18 ottobre 2019;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 1 la DL ing. Pederiva ha ordinato la sospensione degli stessi in data 6.9.2019 per le ragioni ivi meglio specificate, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 13.1.2020 al n. 354;
- con processo verbale di ripresa dei lavori la DL ing. Pederiva ha ordinato la ripresa in data 1° luglio 2020 fissando nel 12 agosto 2020 il termine utile per terminare i lavori, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 6.7.2020 al n. 9640;
- con verbale di sospensione dei lavori n. 2 la DL ing. Pederiva ha ordinato la sospensione degli stessi in data 7 agosto 2020, giusta verbale acquisito al protocollo comunale in data 24.8.2020 al n. 9122, in quanto è emersa la necessità di redigere una perizia di variante;
- in data 25 settembre 2020, giusta prot. n. 10477 l'ing. Pederiva ha consegnato al protocollo comunale la perizia di variante di cui trattasi;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la prima modifica di contratto durante il periodo di validità (variante in corso d'opera) relativa ai lavori di "somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" trasmessa dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio Ambiente" con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 25 settembre 2020 al n. 10477 e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Computo metrico con quadro economico;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro economico di raffronto;
- Schema atto di sottomissione;

CONSIDERATO che tale modifica progettuale risulta completa ed elaborata sulla base delle

schem de contrat da sotscriber co la firma soradita;

- *ai 31 de jené del 2020 l'è stat sotscrit l contrat de apalt di luriers co la firma SEVIS SRL, n. 191/AP de valiva data, sotscrit a na vida digitèla;*
- *col verbal de consegna de prescia di lurieres la DL enj. Alessandro Pederiva l'à consegnà i lurieres ai 19 de aost del 20196, aldò del verbal registrà te protocol de Comun ai 13.1.2020 col n. 353;*
- *per meter a jir i lurieres dic de sora, l'era pervedù 60 dis dal scomenz da la data del verbal medemo, donca da fenir sù dant dai 18 de otober del 2019;*
- *col verbal de sospenjion di lurieres n. 1, la DL enj. Pederiva l'à ordenà la sospenjion di lurieres ai 6.9.2019, per la rejons scrites de meio tel medemo, desche da verbal regsitrà te protocol de comun ai 13.1.2020 col n. 354;*
- *col verbal de desposizion de tachèr endò i lurieres dal 1m de messèl del 2020, registrà te protocol de Comun ai 6.7.2020 col n. 9640, la Direzion di Lurieres l'à comanà che i vegne endò taché, fissan ai 12 de aost del 2020 l termin per i fenir sù;*
- *col verbal de sospenjion di lurieres n. 2, la DL enj. Pederiva l'à ordenà la sospenjion di lurieres ai 7 de aost del 2020, desche da verbal regsitrà te protocol de comun ai 24.8.2020 col n. 9122, ajache l'è vegnù fora l besegn de meter jù na varianta;*
- *ai 25 de setember del 2020, prot n. 10477 l'enj. Pederiva l'à consegna te protocol de comun la perizia de mudament en chestion;*

dit dut chest dantfora,

LA JONTA DE COMUN

VEDÙ l prum mudament del contrat endèna che l'è valevol (mudament endèna che vegn fat i lurieres) per i lurieres de "gran prescia per meter en segurezza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan" enjignà da la DL enj. Alessandro Pederiva del Studie tecnich sozià "Spazio Ambiente" con senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 25 de setember del 2020 col n. 10477, metù adum da chesta documentazion tecnica:

- *Relazion tecnica desmostradiva;*
- *Calcol di cosc con chèder economich ;*
- *Lista di priesc;*
- *Chèder economich comparatif;*
- *Document de sotmetuda;*

CONSCIDRÀ che chest mudament del projet l'è deldut aldò di besegnes palesé da la DL,

necessità espresse dalla DL come illustrate nella Relazione Tecnico-illustrativa e negli elaborati summenzionati; RICONOSCIUTO che, dal quadro economico allegato alla I modifica, si evince che la spesa complessiva dell'opera, a seguito della variante, risulta essere pari ad € 140.000,00-, di cui € 105.678,00- per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza per € 435,65- ed € 34.322,00- per Somme a disposizione dell'Amministrazione; PRECISATO che per effetto delle modifiche proposte il quadro economico viene così a configurarsi:	<i>descheche vegn specificà de miec te la Relazion Tecnica desmostrativa e te la documentazion dita de sora;</i> <i>RECOGNOSCIÙ che, dal prospet economic jontà ite tel I mudament, se veit che l cost en dut di lurieres, dò dal mudament, l'é de € 140.000,00-, spartì sù te € 105.678,00- per lurieres tout ite i cosc per la segurezza de € 435,65- e € 34.322,00- per somes a la leta de l'Aministrazion;</i> <i>PREZISÀ che, aldò di mudamenc proponec, l prospet economic l doventa coscita:</i>
---	--

QUADRO ECONOMICO SOMMA URGENZA					
Lavori		Perizia		Contratto	I modifica contrattuale
lavori di sistemazione	€	90.293,25	€	88.938,85	€ 98.094,45
economie	€	10.249,92	€	10.096,17	€ 7.147,91
oneri per la sicurezza	€	3.040,53	€	3.040,53	€ 435,65
Totale Lavori	€	103.583,70	€	102.075,55	€ 105.678,00
					3.602,45
Somme a disposizione dell'amministrazione					
ribasso d'asta 1,50%			€	1.508,15	€ -1.508,15
imprevisti	€	2.101,93	€	2.101,93	€ 7,63
Spese tecniche	€	8.719,68	€	8.719,68	€ 8.719,68
CNPAIA al 4%	€	348,79	€	348,79	€ 348,79
IVA al 22% su spese tecniche	€	1.995,06	€	1.995,06	€ 1.995,06
IVA al 22% su lavori e imprevisti	€	23.250,84	€	23.250,84	€ 23.250,84
Totale Somme a disposizione	€	36.416,30	€	36.416,30	€ 34.322,00
					-2.094,30
					-3.602,45
TOTALE COMPLESSIVO	€	140.000,00	€	140.000,00	€ 140.000,00

PRECISATO altresì che a seguito di detta modifica i lavori a base d'asta aumentano, in quanto: - l'importo del contratto passa da € 102.075,55- ad € 105.678,00- che vengono finanziati con l'accantonamento del ribasso d'asta e dall'importo per gli imprevisti; ACCERTATO che la modifica del contratto in corso di validità, non comporta variazioni dell'importo complessivo di spesa, e rimane contenuta nel limite di un quinto dell'importo contrattuale (art. 126 c. 5 – varianti progettuali – D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11.5.2012) e risponde ad effettive e sopravvenute ragioni, meritevoli di considerazione in quanto gli interventi aggiuntivi vengono senz'altro a migliorare la qualità delle opere realizzate, come risulta dalla relazione suddetta, alla quale si rimanda per un più dettagliato esame; VISTO in particolare il quadro di variante dal quale si evince un aumento dell'importo contrattuale di € 3.602,45- e, quindi contenuto nel 1/5 previsto dall'art. 126 comma 5 e 8 del D.P.P. 9-84 Leg.; PRECISATO altresì, che le maggiori lavorazioni rispetto all'importo contrattuale ammontano ad € 3.602,45-, (contratto originario € 102.075,55- variante € 105.678,00- e quindi inferiore	<i>PREZISÀ ence che, aldò de chest mudament, la soma di lurieres la va sù, e, donca:</i> - <i>la soma en dut del contrat la passa da € 102.075,55- a € 105.678,00-, che i vegn finanzié co la zifra metuda da na man del rebas di lurieres (e con chela di cosc no pervedui;</i> <i>ZERTÀ che l mudament del contrat endèna che l'é en esser no l porta neguna mudazion te la soma en dut e, amò apede, l stèsc ite tel limit de 1/5 de la soma del contrat (art. 126, c. 5 – mudamenc ai projec – D.P.J.P. n. 9-84/Leg. dai 11.5.2012) e, amò apede, l'é aldò di besegnes entravegnui enderdèna, da conscidrèr ajache i intervenc neves i miora zenz'auter la calità di lurieres, descheche se enten ence da la relazion jontèda ite, a chela che vegn fat referiment per na analisa più specifìca;</i> <i>VEDÙ soraldut l prospet de mudament, olache vegn moscià che l'é n smaorament de la soma del contrat de € 3.602,45- e che, donca, l stèsc ite te l'1/5 pervedù da l'art. 126 comes 5 e 8 del D.P.P. 9-84/Leg.;</i> <i>PREZISÀ ence che i maores lurieres respet a la soma del contrat i é de € 3.602,45- (prum contrat € 102.075,55- mudament € 105.678,00- e, donca, mendres che l'1/5 de obligh da contrat (€ 20.415,09-</i>
---	---

al quinto d'obbligo contrattuale (€ 20.415,09-)), ed è contenuta altresì nel 15% del valore iniziale del contratto originario;

ACCERTATO che la fattispecie della modifica in esame trova codifica nell'ambito dell'art. 27 della L.P. n. 2 del 9.3.2016 "Modifica dei contratti durante il periodo di validità" e ss.mm. in quanto ai sensi del comma 2, lett. f):

1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia (...) al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori;

2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto.

PRECISATO che gli interventi previsti nella presente modifica non potevano ragionevolmente essere previsti in fase di predisposizione del progetto e di approvazione dello stesso;

VISTO pertanto il Regolamento di attuazione della L.P. n. 26 del 10.9.1993 e ss.mm., approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012, per cui i lavori conseguenti la variante progettuale sono stati affidati agli esecutori ai sensi dell'art. 126 comma 5 e la perizia suppletiva di variante è accompagnata da uno schema di Atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dall'Impresa SEVIS SRL;

VISTO quindi lo schema di Atto di sottomissione n. 1 con il quale l'impresa si dichiara e si obbliga ad accettare le variazioni apportate e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione l'esecuzione dei lavori oggetto di perizia e le disposizioni che saranno impartite dalla D.L. in corso d'opera agli stessi prezzi, patti, norme e condizioni del contratto originario;

RITENUTO altresì di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all'Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga di Fassa (TN), appaltatrice dell'opera principale;

DATO ATTO che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non viene prorogato;

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare la I modifica al contratto originario al progetto riguardante i lavori di "somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardecchia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" trasmessa dalla DL ing. Pederiva e acquisita al protocollo comunale il 25.9.2020 al n. 10477;

VISTO l'art. 47 dello Statuto del Comune di Sèn Jan di Fassa approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 63 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 59 del 28 dicembre 2017;

VISTA la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 52 e 53, nonché il suo regolamento di attuazione approvato con DPP

)) e i stèsc ite tel 15% del valor de scomenz del prum contrat;

ZERTÀ che l cajo del mudament en costion l vegn desponet da l'art. 27 de la L.P. n. 2 dai 9.3.2016 "Mudament di contrac endèna che i é valevoi" e s.m., ajache l'é aldò del coma 2, letra f);

1) l valor del mudament l'é mender sibie del limit comunitèr, sibie (...) del 15 per cent del valor de scomenz del contrat, per i contrac de lurieres;

2) l mudament no l sbalanza la natura globala del contrat.

PREZISÀ che i intervenc metui dant te chest mudament no i podea vegnir pervedui, a rejon, endèna che vegnìa enjignà e aproà l projet;

VEDÙ donca l Regolament che met en doura la L.P. n. 26 dai 10.09.1993 e s.m., aproà col D.P.J.P. n. 9-84/Leg. dai 11 de mé del 2012, aldò de chel che i lurieres del mudament de projet i g'è stac dac sù a la medema firma aldò de l'art. 126 coma 5 e apede la perizia de integrazion e de mudament l'é l schem de Document de sotmetuda, sottoscrit per azetazion da la firma SEVIS SRL;

VEDÙ donca l schem de Document de sotmetuda n. 1 con chel che la firma la se declarea e la se obliga a azetèr i mudamenc metui en esser e la se tol l'empegn de meter en esser, senza neguna eccezion, i lurieres pervedui da la perizia e la disposizioni che ge vegnarà dat da la D.L. endèna i lurieres, al medemo priesc e co la medema condizions del contrat de scomenz;

CONSCIDRÀ de ge dèr sù ence i lurieres de enjonta pervedui dal mudament en costion a la Firma SEVIS SRL, con senta legala a Soraga (TN), che l'aea jà ciapà i lurieres prinzipèi de la operes;

DAT AT che, per via di lurieres de enjonta che vegn ca dal mudament en costion, l termen per fenir sù i lurieres no l vegn sperlongià;

CONSCIDRÀ donca de aproèr l prum mudament al contrat de scomenz che l vèrda i lurieres de "gran prescia per meter en segurezza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecchia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan" enjignà da la DL enj. Alessandro Pederiva e registrà te protocol de Comun ai 25.9.2020 col n. 10477;

VEDÙ l'art. 47 del Statut del Comun de Sèn Jan aproà co la deliberazion del Consei de Comun de Poza n. 63 dai 28 de dezember del 2017 e co la deliberazion del Consei de Comun de Vich n. 59 dai 28 de dezember del 2017;

VEDÙ la L.P. 10.9.1993 n. 26 e s.m. e avisa i art. 52 e 53 e ence sie regolament de metuda en doura aproà col DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

11.5.2012 n. 9-84/Leg.;

VISTA la L.P. 2/2016 ed in particolare l'art. 27 "Modifica dei contratti durante il periodo di validità", comma 2 lett. f);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 28.11.2019 avente ad oggetto: "Art. 126 del Codice degli Enti Locali. Modifica e riapprovazione degli atti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei singoli servizi adottati dal Commissario straordinario con Decreto n. 78 del 12 aprile 2018.";

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 18.3.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 18.3.2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

VISTO il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. del 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere in merito;

ALL'UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la prima modifica al contratto originario (I variante in corso d'opera) relativa ai lavori di "somma urgenza per messa in sicurezza del tratto di strada forestale e dell'acquedotto comunale compreso tra i due guadi del rio Sojal di quota 1600 e 1700 m s.l.m. nella valle di Gardeccia nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" trasmessa dalla DL ing. Alessandro Pederiva dello Studio Tecnico Associato "Spazio

VEDÙ la L.P. n. 2/2016 e s.m. e avisa l'art. 27 "Mudamenc di contrac endèna che i é en doura, coma 2 let. f);

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 175 dai 28.11.2019 dintornvìa: "Art. 126 del Codesc di Enc Locai. Mudèr e aproèr da nef la encèries che ge pervegn al Secretèr de Comun e ai Responsaboi di Servijes dates fora dal Comissèr straordenèr con sie Decret n. 78 dai 12 de oril del 2018";

VEDÙ l Regolament de Endrez en doura del Comun de Sèn Jan;

VEDÙ l nef Regolament de contabilità aproà co la deliberazion del Consei de Comun n. 61 dai 31.12.2019;

VEDÙ la deliberazion del Consei de Comun n. 10 dai 18 de mèrz del 2020 che à per agoment: "Aproazion del Bilanz de Previjon 2020-2022 e de la nota Integrativa (Bilanz armonisà enjonta 9 del D.Lgs. 118/2011) e l Document Unich de Programazion 2020-2022";

VEDÙ la deliberazion de la Jonta de Comun n. 41 dai 18 de mèrz del 2020 che à per argoment: "Aproazion del Pian Esecutif de Gestion per i trei egn 2020-2022";

VEDÙ l "Codesc di Enc locai de la Region autonoma Trentin-Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l parer enjontà de regolarità technicaministrativa dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di conc dat jù dintornvìa la proponeta de deliberazion, scialdi aldò de l'art. 185 del C.E.L. aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2;

VEDÙ l besegn de declarèr chesta deliberazion en doura sobito, aldò de l'art. 183, c. 4, del Codesc di Enc Locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol, aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache che l'é prescia de jir inant en cont de chest;


CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes aldò de lege (a una 5, de contra 0, 0 no dates jù, sun 5 che à tout pèrt e che à lità)

DELIBERA

1. de aproèr, per la rejons spezfichèdes sunsora, l prum mudament del contrat endèna che l'é valevol (mudament endèna che vegn fat i lurieres) per i lurieres de "gran prescia per meter en segurezza l tòch de strèda da bosch e l bosserlait de Comun anter i doi passajes sul Ruf de Soal a 1600 e 1700 metres sora l mèr te Val de Gardecia, sul tegnir del Comun de Sèn Jan" enjignà da la DL enj. Alessandro Pederiva del Studie technic sozià "Spazio Ambiente" con

Ambiente” con sede a Cavalese (TN), acquisita al protocollo comunale in data 25 settembre 2020 al n. 10477, composta dagli elaborati meglio elencati in premessa, e acclarante il nuovo importo contrattuale in € 105.678,00- con un aumento di € 3.602,45- rispetto all’importo contrattuale originario di € 102.075,55-, e il costo totale dell’opera in complessivi € 140.000,00-, e risulta essere così suddiviso: - € 105.678,00- per lavori al netto del ribasso d’asta dell’1,50% di cui 435,65- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - € 34.322,00- per somme a disposizione dell’Amministrazione; corrispondente esattamente a quanto finanziato a suo tempo; 2. di affidare i lavori suppletivi previsti dalla suddetta modifica all’Impresa SEVIS SRL con sede legale a Soraga (TN), appaltatrice dell’opera principale; 3. di precisare che l’Impresa suddetta ha assunto l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante direttamente con la sottoscrizione del relativo Schema di Atto di sottomissione n. 1 che ridetermina il nuovo importo contrattuale in € 105.678,00- (€ 105.242,35- al netto degli oneri della sicurezza per € 435,65-); 4. di autorizzare di conseguenza la stipula dell’Atto di sottomissione n. 1; 5. di dare atto che per effetto dei lavori aggiuntivi derivanti dalla modifica in esame, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori resta invariato; 6. di dare atto che la spesa derivante dall’aumento dell’importo contrattuale pari ad € 4.394,99- (€ 3.602,45- più IVA al 22%) trova imputazione al Cap. 29105 Art. 504 del Bilancio EF 2020 (capitolo finanziato da FPV); 7. di inviare copia del presente provvedimento all’Impresa SEVIS SRL e alla DL ing. Alessandro Pederiva per pec, nonché al Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per posta elettronica per gli adempimenti conseguenti, prima fra tutti la pubblicazione sul sito www.comune.senjandifassa.tn.it dell’avviso di approvazione della modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, della L.P. 2/2016 ess.mm.; 8. di trasmettere altresì copia della presente al Servizio Prevenzioni Rischi della PAT per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della I variante al progetto di somma urgenza; 9. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 10. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere con i pagamenti in questione;	senta a Ciavaleis (TN), registrà te protocol de comun ai 25 de setember del 2020, col n. 10477 metù adum da la documentazion tecnica spezifichèda sunsora, olache vegn metù dant la soma neva del contrat de € 105.678,00- con n smaorament de € 3.602,45- respet a la soma de scomenz de € 102.075,55- per l cost en dut di lurieres de € 140.000,00-, spartì sù coscita: - € 105.678,00- per lurieres al net del rebas de garejèda de l’1,50% tout ite € 435,65- per cosc per la segurezza no sotmetui a rebas; - € 34.322,00- per somes a la leta de l’Aministrasion; che corespon ghenao con chel che l’era stat finanzià timpruma; 2. de ge dèr sù i lurieres de integrazion pervedui dal mudament en costion a la firma SEVIS SRL da Soraga (TN), che l’à jà ciapà i lurieres prinzipèi; 3. de prezisèr che la Firma en costion la se à tout sù l’empegn de fèr, senza neguna ecezion, i lurieres de integrazion e de mudament diretamente co la sotscrizion del Schem de Document de sotmetuda n. 1 con chel che vegn calcolà da nef la soma del contrat te € 105.678,00- (€ 105.242,35- al net di cosc per la segurezza per € 435,65-); 4. de autorisèr donca la sotscrizion del Document de sotmetuda n. 1; 5. de dèr at che, per via di lurieres de enjonta che vegn ca dal mudament en costion, l termen per fenir sù i lurieres no l vegn sperlongià 6. de dèr at che l cost che vegn ca dal smaorament de la soma del contrat, de € 4.394,99- (€ 3.602,45- + SVE al 22%) l troa post sul Cap. 29105 Art. 504 del Bilanz AF 2020 (capitol finanzià da FPV); 7. de ge manèr ence chest provediment a la Firma SEVIS SRL e a la DL enj. Alessandro Pederiva per PEC, e al Servije Lurieres Publics e Patrimonie per posta eletronica per i adempimenc che ge pervegn, prum de dut per la publicazion sul sit www.comune.senjandifassa.tn.it de l’avis de aproazion del mudament al contrat, aldò de l’art. 27, c. 3 de la L.P. 2/2016 e s.m.; 8. de ge manèr ence na copia de chest provediment al Servije Prevenziions Risesc de la PAT tras interoperabilità Pi.Tre., ensema co la copia del l^m mudament al projet di lurieres de prescia; 9. de ge manèr na copia de chesta deliberazion ai Capigrop de Consei; 10. de declarèr, con n’altra litazion con duta la stimes a una, che chesta deliberazion la vae en doura sobito aldò de l’art. 183, coma 4, del C.E.L. aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l’è prescia de jir inant en cont de chest;
---	---

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: • di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; • ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2.7.2010, n 104; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. Serv.LL.PP.ePatr./FC/ew	<i>11. de dèr at che, aldò de l'art. 4 de la L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., de contra a chesta deliberazion vegn ametù:</i> • oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie fora l trat de temp de sia publicazion, da ge meter dant a la Jonta de Comun, aldò de la desposizioni coordinèdes de l'art. 183, coma 5, del C.E.L. aproà co la L.R. n. 2 dai 3 de mé del 2018; • recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant che sie fora 60 dis, aldò di articoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n 104; • recors straordenèr al President de la Republica da pèrt de chi che à n enteress, per rejons de legittimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del 1971, n. 1199. I documenc che vèrda la prozedures per dèr sù lurieres, servijes o compres publiques, tout ite la prozedures per dèr sù encèries de projetazion e de ativitèdes tecnich-amministratives coleèdes, i pel vegnir contesté demò con n recors al T.A.R. de Trent, dant de 30 dis, aldò di articoi 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010. n. 104.
--	--

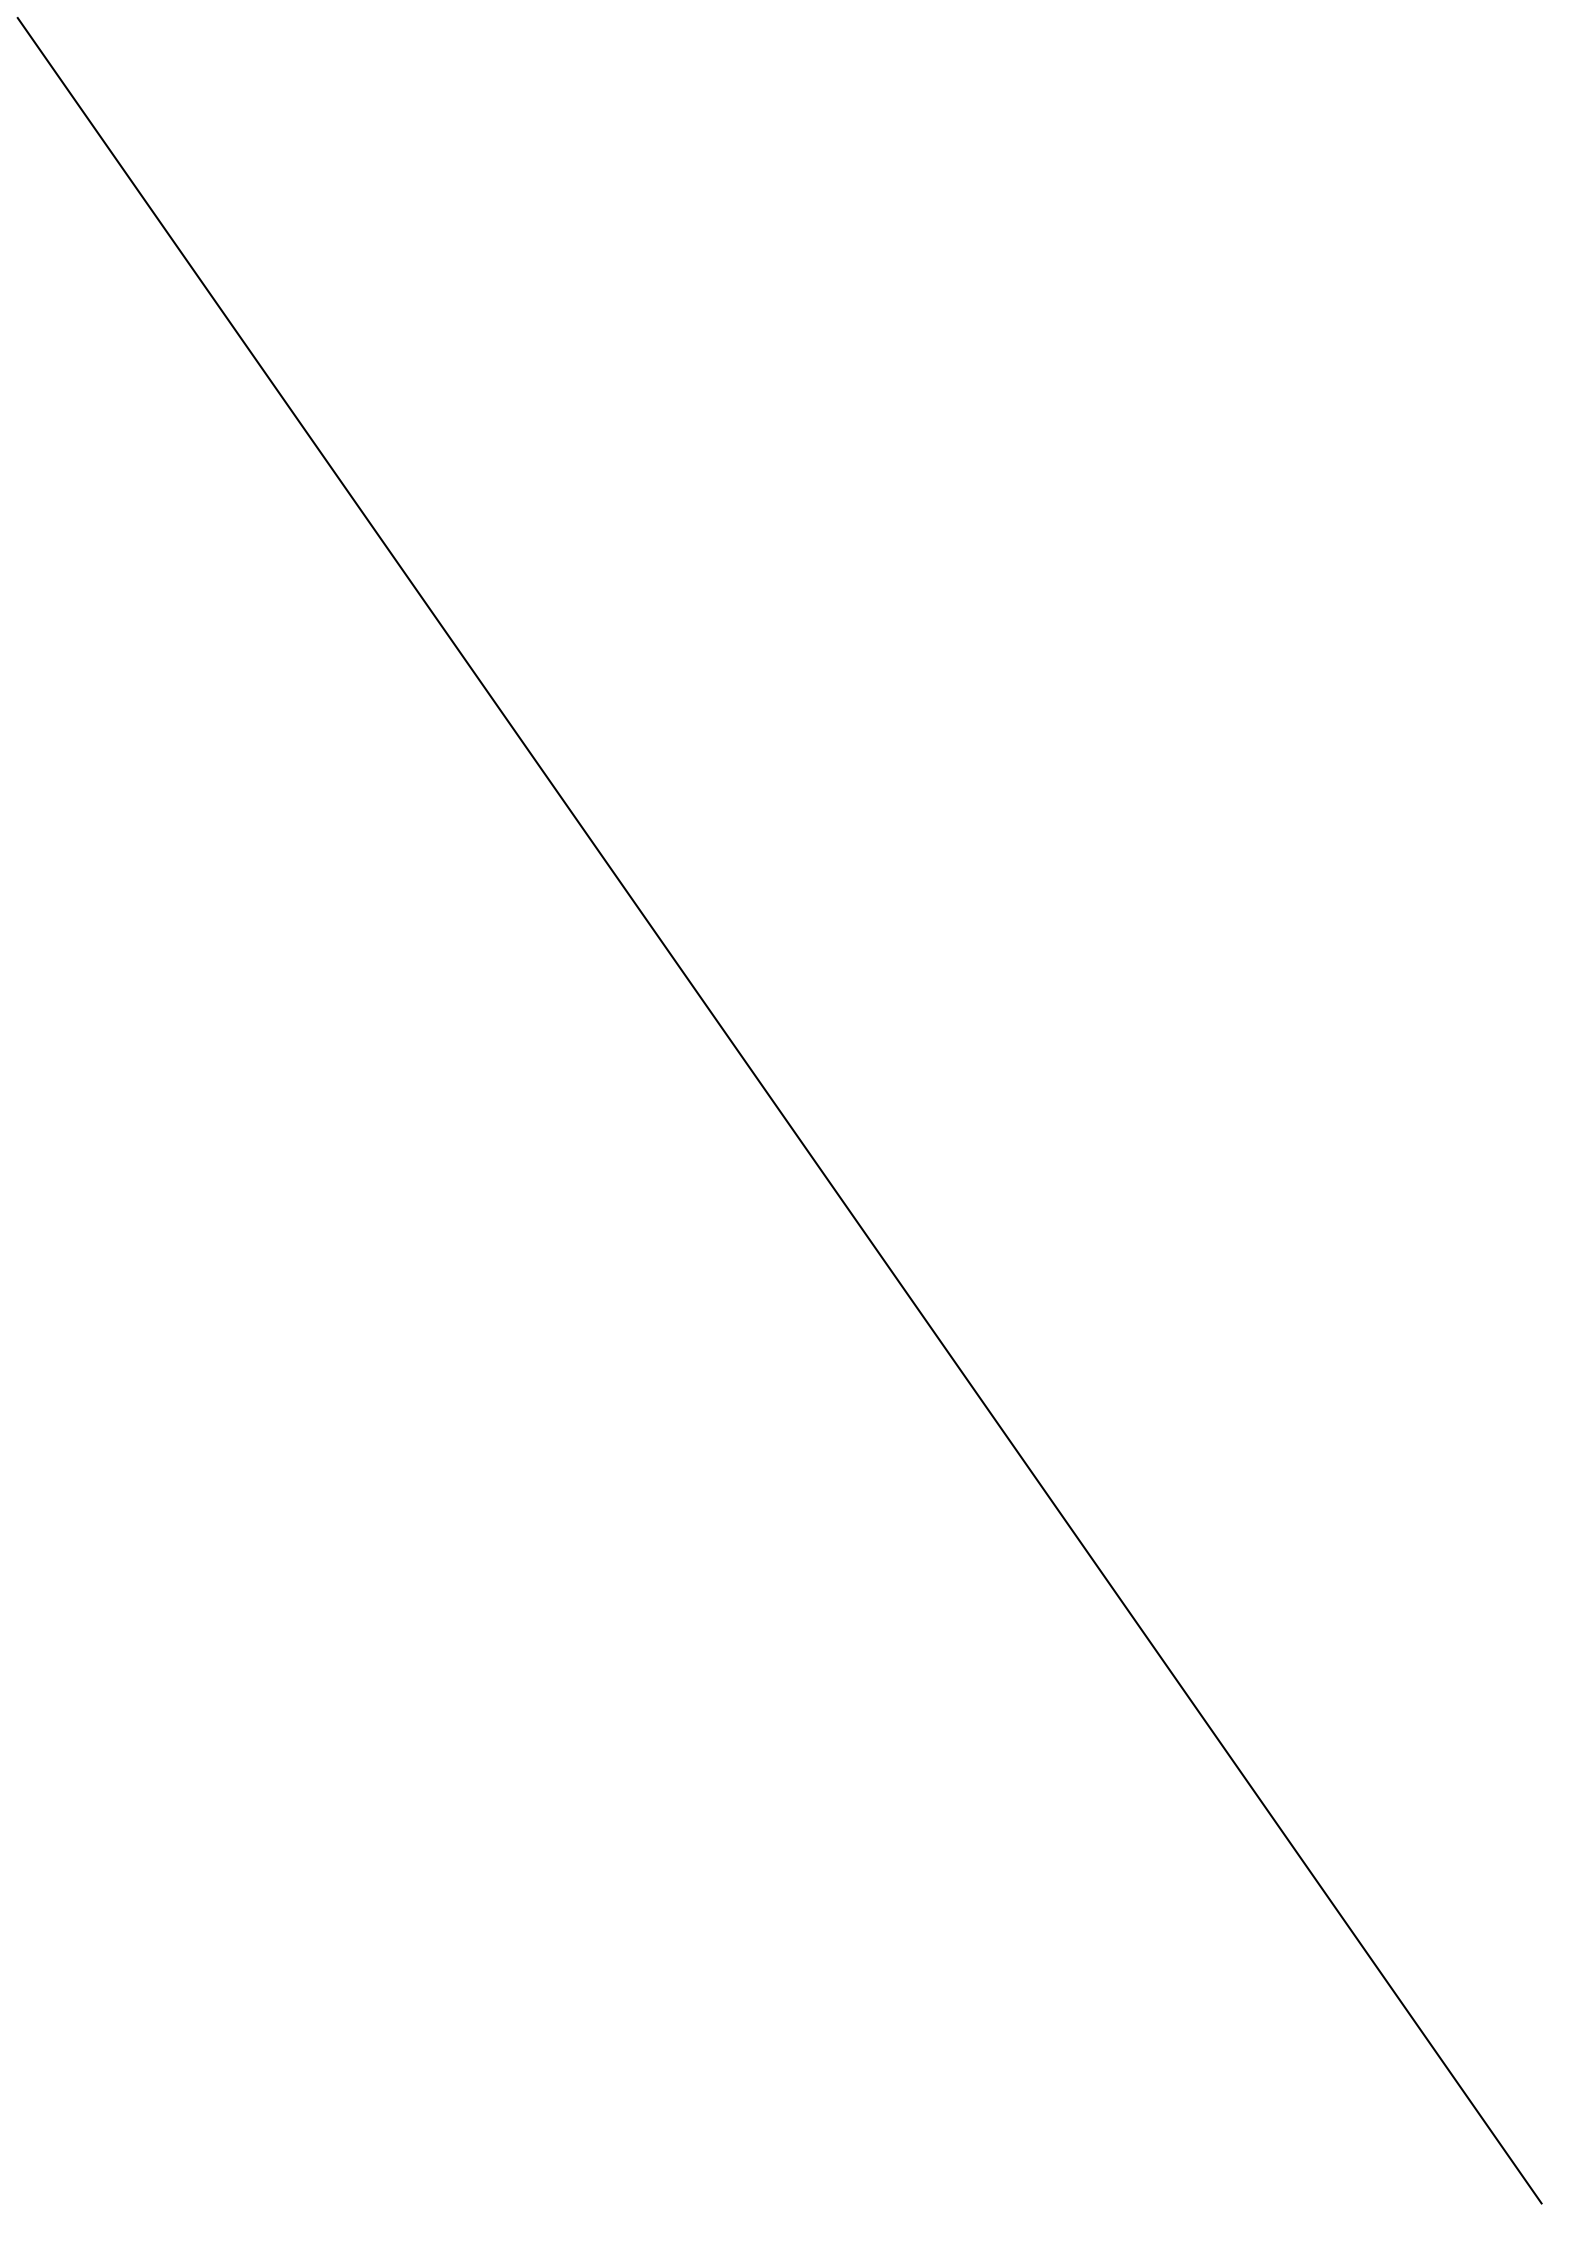

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.

Il Sindaco /L'Ombolt
Giulio Florian

Il Segretario generale supplente/L Secretèr generèl suplent
dott.ssa Elisabetta Gubert

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papièr senza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 30 ottobre 2020 / 30 de otober del 2020

Visto/Vedù: Il Segretario generale supplente/L Secretèr generèl supllent

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l'albo, la ge vegn comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l'art. 183, coma 2, del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Il Segretario generale supplente /L Secretèr generèl suplent
dott.ssa Elisabetta Gubert

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data **10/11/2020**.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l'albo de comun senza che sie ruà denunzies perché no legitima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en doura dal 10/11/2020.

Addi/Ai

Il Segretario generale supplente /L Secretèr generèl suplent

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4' coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.

Li/Ai, 30 ottobre 2020 / 30 de otober del 2020

Il Segretario generale supplente /L Secretèr generèl suplent
dott.ssa Elisabetta Gubert
